

RICOSTRUZIONE
SISMA 2012


EDIFICI MUNICIPALI
TEMPORANEI

SCHEDA TECNICA

COMUNE DI MIRANDOLA
Provincia di Modena

LOTTO n.5

ALLEGATO 2

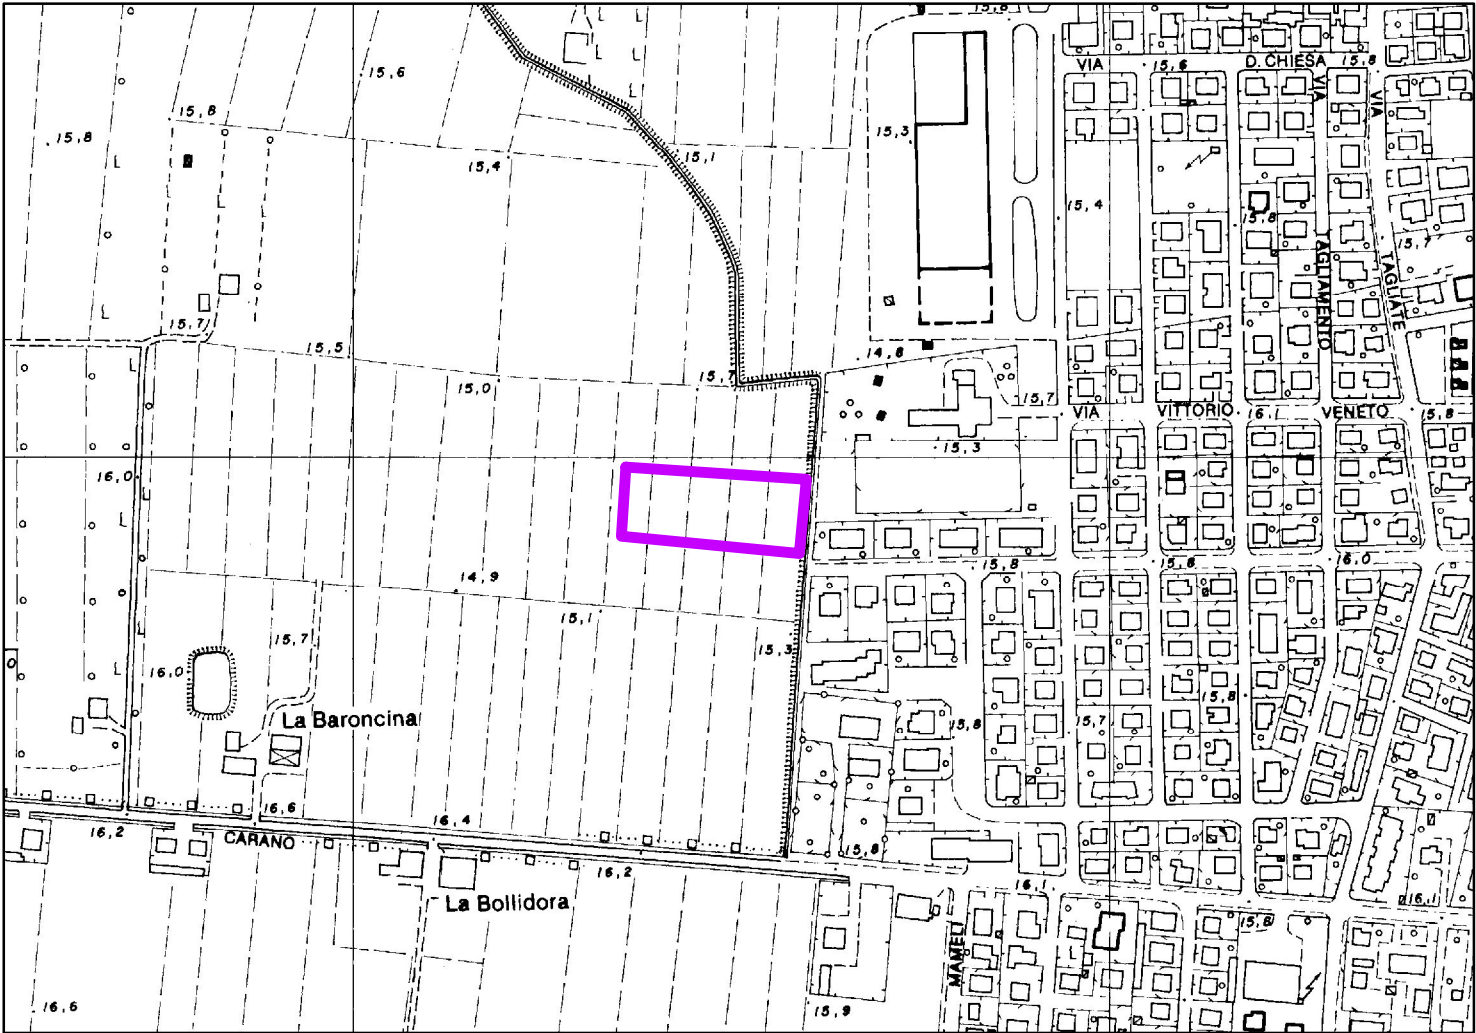


inquadramento area



estratto ortofoto

Lotto	N. 5			
ubicazione	Fg. 108	map.le 895 parte (5.600 m2)		
dimensione lotto	5.600	m ²		
Municipio	richieste	note	parametro di progetto	
n. max persone presenti			n.	295
classificazione ai sensi DM 22.02.2006			tipo	2
max affollamento per attività			pers/m ²	0,1
max affollamento sale convegni			pers/m ²	0,7
max affollamento per zone pubblico			pers/m ²	0,4
Uffici				
n. addetti totale	190		m ² /addetto	10 1900
n. politici	7		m ² /addetto	10 70
totale uffici				1.970
ufficio Assessori (6)	1			
ufficio Sindaco	1			
ufficio Responsabile	27			
n. ufficio da 1 postazione front office	0			
n. ufficio da 2 postazione front office	1			
n. ufficio da 3 postazione front office	2			
n. ufficio da 4 postazione front office	3			
n. ufficio da 5 postazione front office	1			
n. ufficio da 1 postazione back office	23			
n. ufficio da 2 postazione back office	27			
n. ufficio da 3 postazione back office	8			
n. ufficio da 4 postazione back office	1			
n. ufficio da 5 postazione back office	5			
n. ufficio da 6 postazione back office	1			
connettivo, altri spazi comuni e spogliatoi PM				
Spazi accessori				
sala Consiglio	1	150 m2- 99 persone	n. persone	99 150
sala Giunta	1	12 posti	n. persone	12 25
sala riunioni	3		n. persone	10 60
archivio	1		m ²	150
archivio	1	deposito di materiale vario per uffici e pulizie	m ²	40
CED sala server	1	climatizzato	m ²	20 20
armeria	1	blindata	m ²	10 10
spazi attesa			m ²	40
stamperia	1		m ²	20 20
servizi igienici	30		n. servizi/ pers	0,1 162
totale spazi accessori				677
COMPLESSIVO				2647

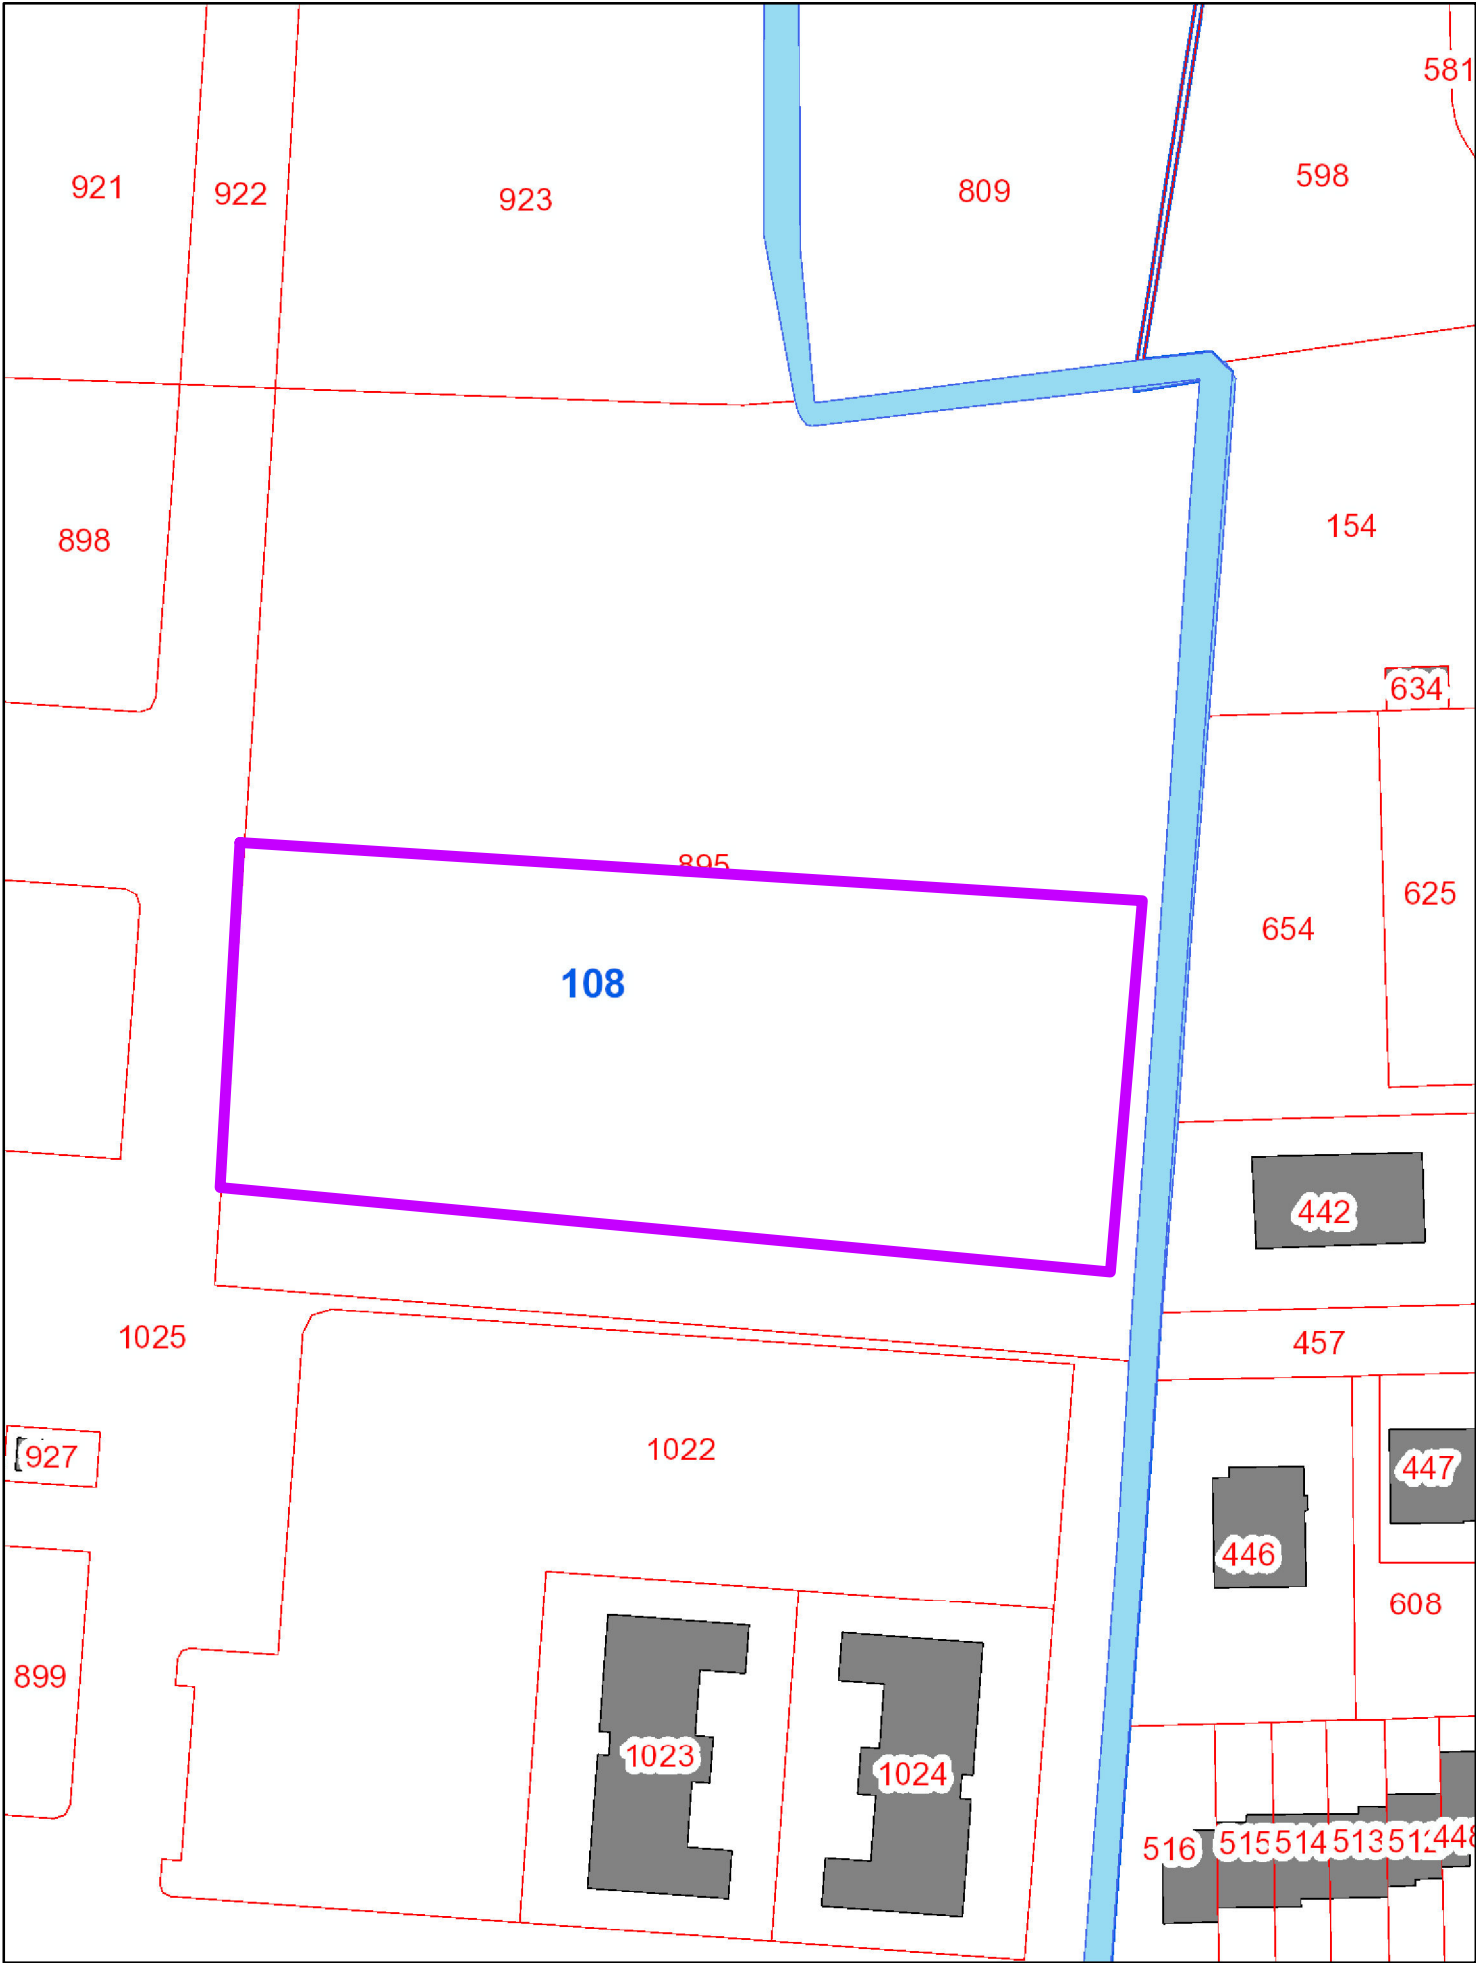

estratto catastale Fg 108
map.le 895 parte
